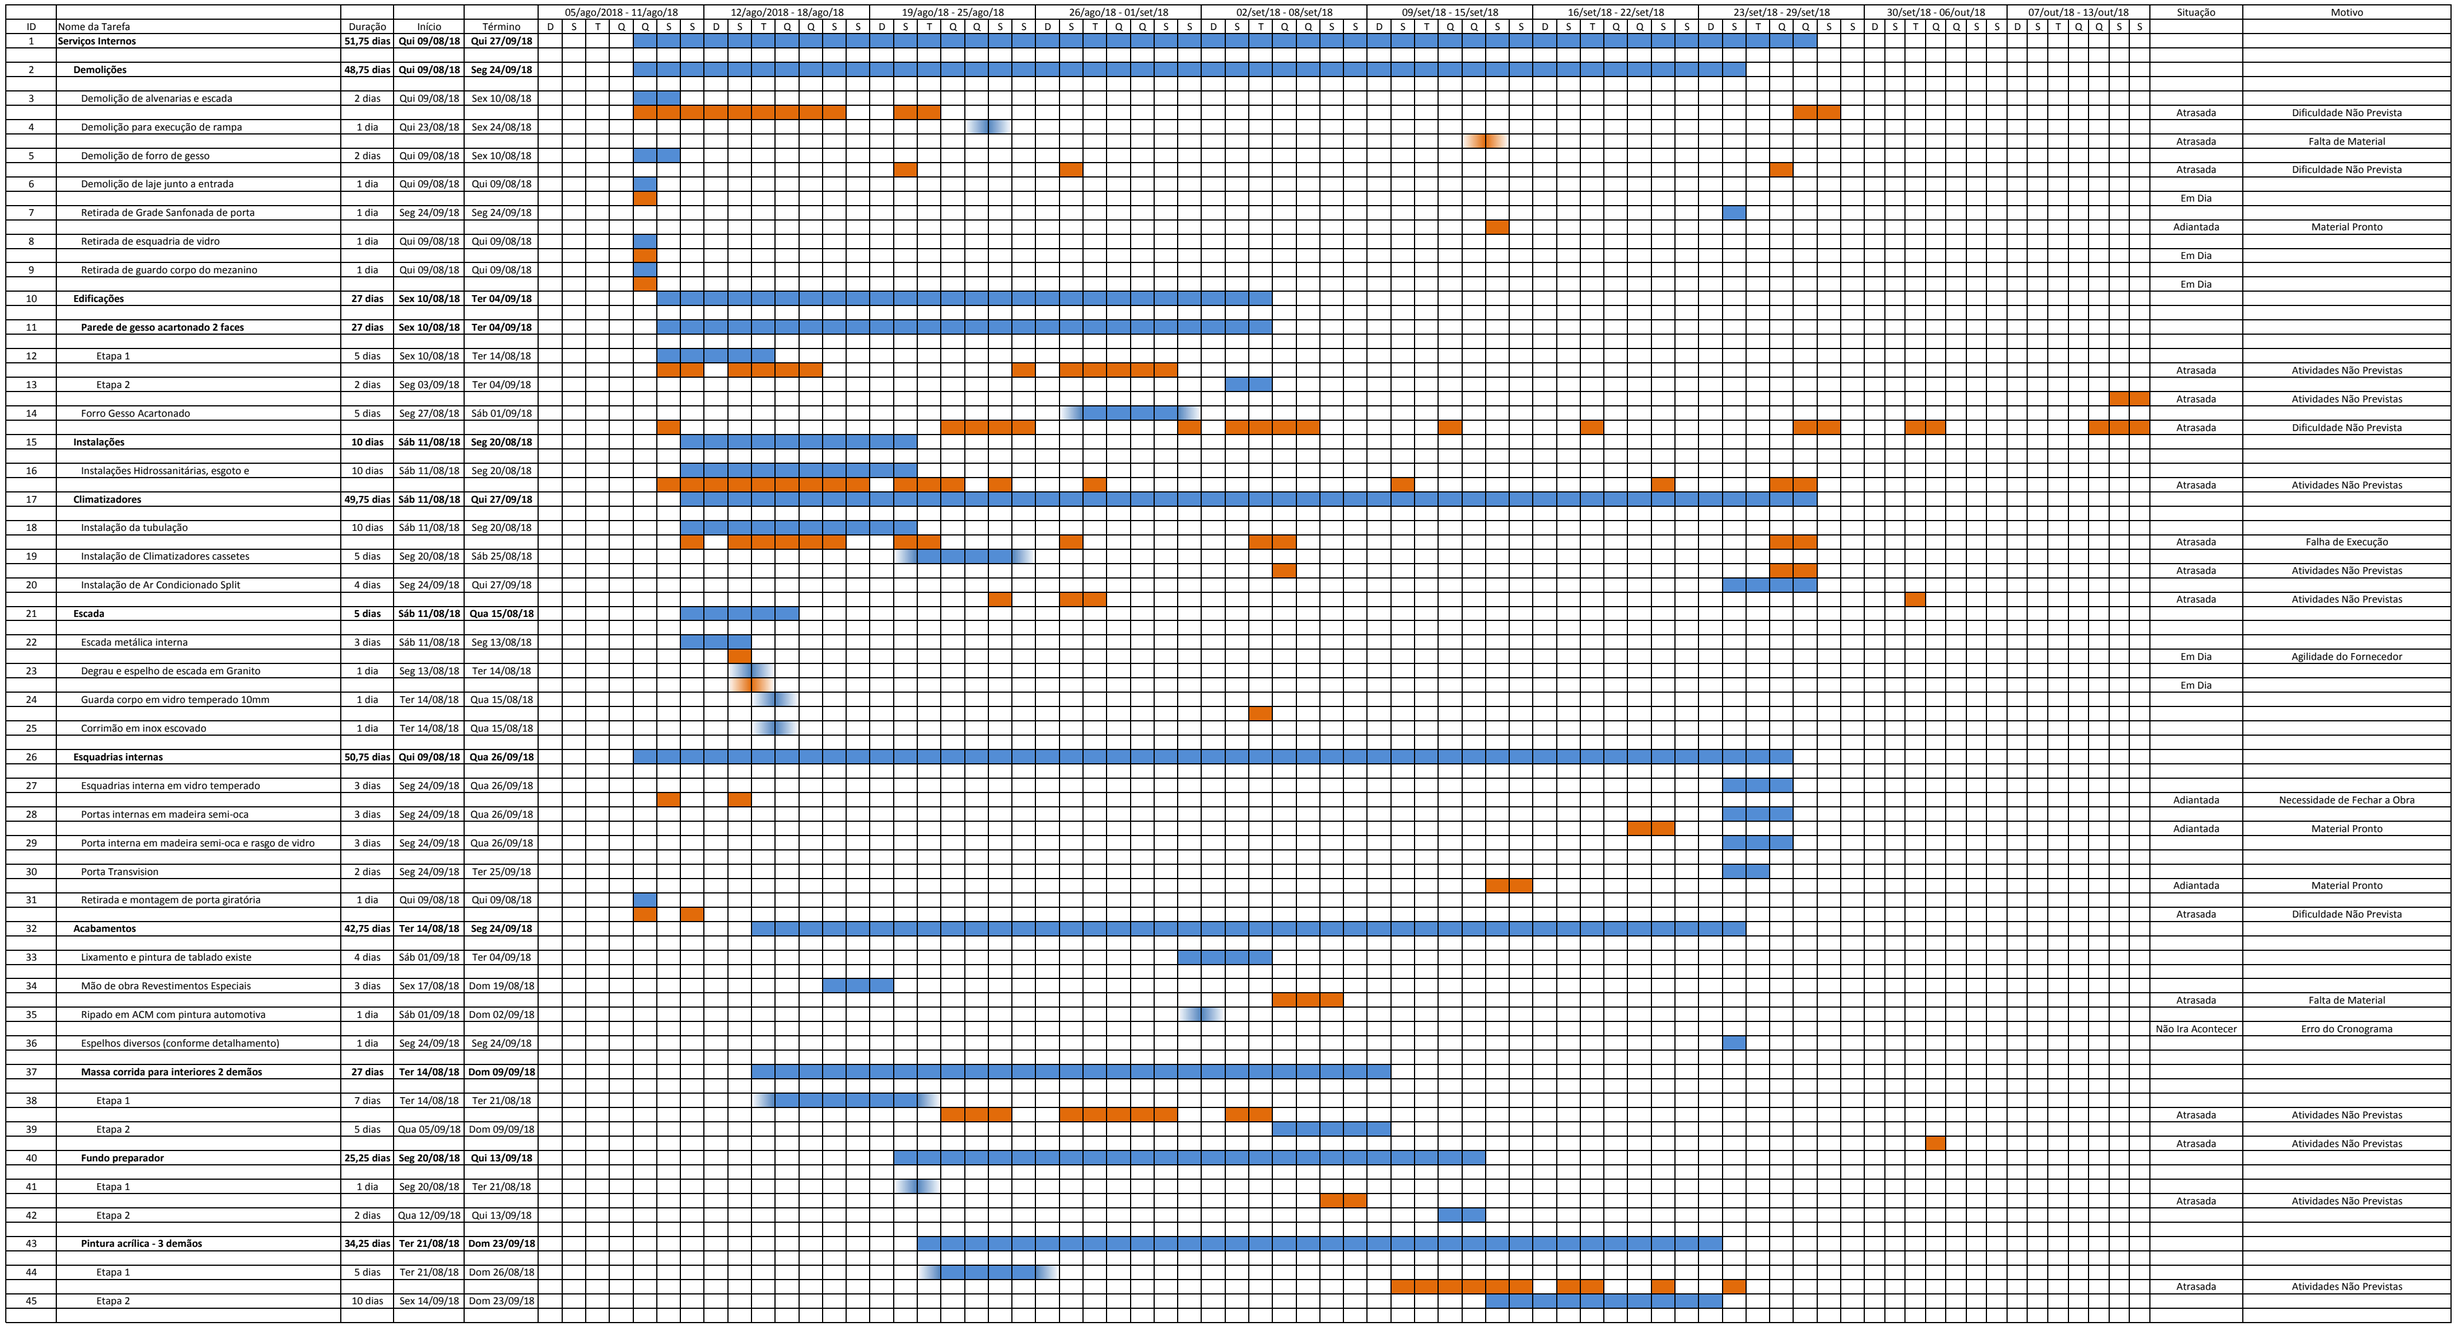ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Situação	Motivo
1	**Serviços Internos**	**51,75 dias**	**Qui 09/08/18**	**Qui 27/09/18**		
2	**Demolições**	**48,75 dias**	**Qui 09/08/18**	**Seg 24/09/18**		
3	Demolição de alvenarias e escada	2 dias	Qui 09/08/18	Sex 10/08/18		
					Atrasada	Dificuldade Não Prevista
4	Demolição para execução de rampa	1 dia	Qui 23/08/18	Sex 24/08/18		
					Atrasada	Falta de Material
5	Demolição de forro de gesso	2 dias	Qui 09/08/18	Sex 10/08/18		
					Atrasada	Dificuldade Não Prevista
6	Demolição de laje junto a entrada	1 dia	Qui 09/08/18	Qui 09/08/18		
					Em Dia	
7	Retirada de Grade Sanfonada de porta	1 dia	Seg 24/09/18	Seg 24/09/18		
					Adiantada	Material Pronto
8	Retirada de esquadria de vidro	1 dia	Qui 09/08/18	Qui 09/08/18		
					Em Dia	
9	Retirada de guardo corpo do mezanino	1 dia	Qui 09/08/18	Qui 09/08/18		
					Em Dia	
10	**Edificações**	**27 dias**	**Sex 10/08/18**	**Ter 04/09/18**		
11	**Parede de gesso acartonado 2 faces**	**27 dias**	**Sex 10/08/18**	**Ter 04/09/18**		
12	Etapa 1	5 dias	Sex 10/08/18	Ter 14/08/18		
					Atrasada	Atividades Não Previstas
13	Etapa 2	2 dias	Seg 03/09/18	Ter 04/09/18		
					Atrasada	Atividades Não Previstas
14	Forro Gesso Acartonado	5 dias	Seg 27/08/18	Sáb 01/09/18		
					Atrasada	Dificuldade Não Prevista
15	**Instalações**	**10 dias**	**Sáb 11/08/18**	**Seg 20/08/18**		
16	Instalações Hidrossanitárias, esgoto e	10 dias	Sáb 11/08/18	Seg 20/08/18		
					Atrasada	Atividades Não Previstas
17	**Climatizadores**	**49,75 dias**	**Sáb 11/08/18**	**Qui 27/09/18**		
18	Instalação da tubulação	10 dias	Sáb 11/08/18	Seg 20/08/18		
					Atrasada	Falha de Execução
19	Instalação de Climatizadores cassetes	5 dias	Seg 20/08/18	Sáb 25/08/18		
					Atrasada	Atividades Não Previstas
20	Instalação de Ar Condicionado Split	4 dias	Seg 24/09/18	Qui 27/09/18		
					Atrasada	Atividades Não Previstas
21	**Escada**	**5 dias**	**Sáb 11/08/18**	**Qua 15/08/18**		
22	Escada metálica interna	3 dias	Sáb 11/08/18	Seg 13/08/18		
					Em Dia	Agilidade do Fornecedor
23	Degrau e espelho de escada em Granito	1 dia	Seg 13/08/18	Ter 14/08/18		
					Em Dia	
24	Guarda corpo em vidro temperado 10mm	1 dia	Ter 14/08/18	Qua 15/08/18		
25	Corrimão em inox escovado	1 dia	Ter 14/08/18	Qua 15/08/18		
26	**Esquadrias internas**	**50,75 dias**	**Qui 09/08/18**	**Qua 26/09/18**		
27	Esquadrias interna em vidro temperado	3 dias	Seg 24/09/18	Qua 26/09/18		
					Adiantada	Necessidade de Fechar a Obra
28	Portas internas em madeira semi-oca	3 dias	Seg 24/09/18	Qua 26/09/18		
					Adiantada	Material Pronto
29	Porta interna em madeira semi-oca e rasgo de vidro	3 dias	Seg 24/09/18	Qua 26/09/18		
30	Porta Transvision	2 dias	Seg 24/09/18	Ter 25/09/18		
					Adiantada	Material Pronto
31	Retirada e montagem de porta giratória	1 dia	Qui 09/08/18	Qui 09/08/18		
					Atrasada	Dificuldade Não Prevista
32	**Acabamentos**	**42,75 dias**	**Ter 14/08/18**	**Seg 24/09/18**		
33	Lixamento e pintura de tablado existe	4 dias	Sáb 01/09/18	Ter 04/09/18		
34	Mão de obra Revestimentos Especiais	3 dias	Sex 17/08/18	Dom 19/08/18		
					Atrasada	Falta de Material
35	Ripado em ACM com pintura automotiva	1 dia	Sáb 01/09/18	Dom 02/09/18		
					Não Ira Acontecer	Erro do Cronograma
36	Espelhos diversos (conforme detalhamento)	1 dia	Seg 24/09/18	Seg 24/09/18		
37	**Massa corrida para interiores 2 demãos**	**27 dias**	**Ter 14/08/18**	**Dom 09/09/18**		
38	Etapa 1	7 dias	Ter 14/08/18	Ter 21/08/18		
					Atrasada	Atividades Não Previstas
39	Etapa 2	5 dias	Qua 05/09/18	Dom 09/09/18		
					Atrasada	Atividades Não Previstas
40	**Fundo preparador**	**25,25 dias**	**Seg 20/08/18**	**Qui 13/09/18**		
41	Etapa 1	1 dia	Seg 20/08/18	Ter 21/08/18		
					Atrasada	Atividades Não Previstas
42	Etapa 2	2 dias	Qua 12/09/18	Qui 13/09/18		
43	**Pintura acrílica - 3 demãos**	**34,25 dias**	**Ter 21/08/18**	**Dom 23/09/18**		
44	Etapa 1	5 dias	Ter 21/08/18	Dom 26/08/18		
					Atrasada	Atividades Não Previstas
45	Etapa 2	10 dias	Sex 14/09/18	Dom 23/09/18
